


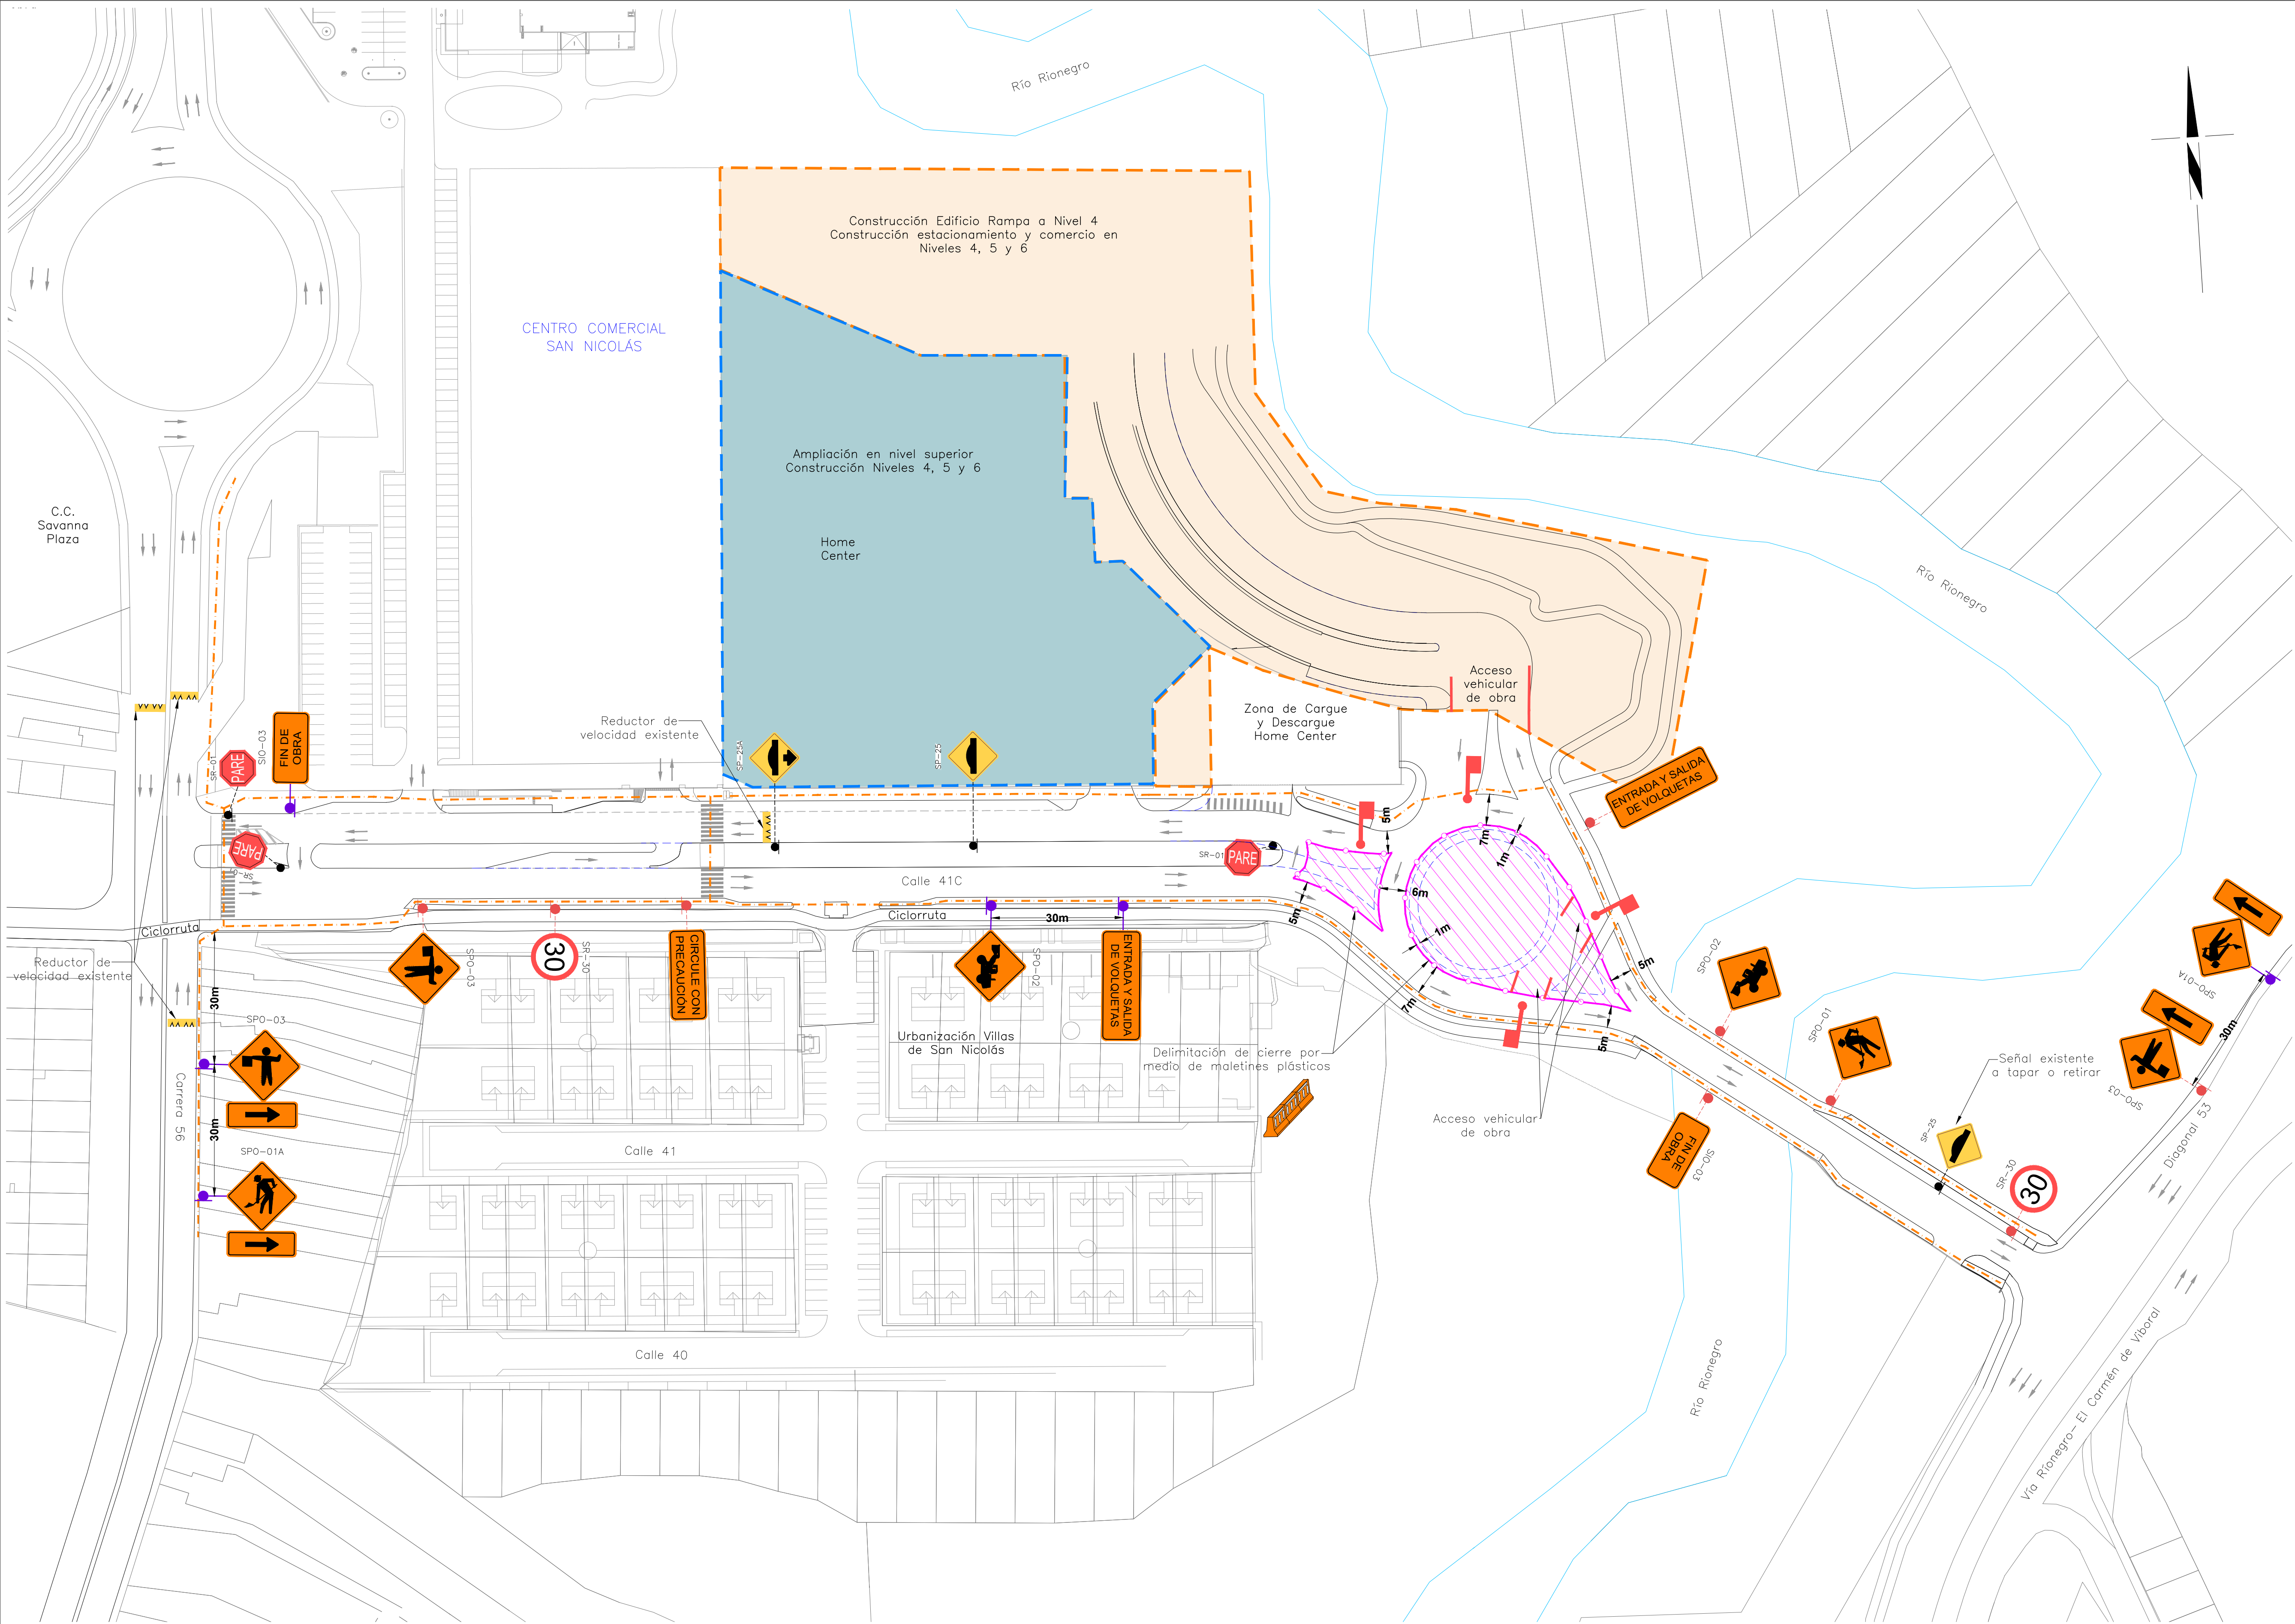

CONVENCIONES

Área para construcción edificio rampa
ampliación centro comercial

Área para construcción de lasas superiores
a Home Center ampliación centro comercial

Cierres de obra para construcción de
glorieta a nivel y nuevos bordes de vía

Recorridos habilitados para la
circulación de peatones

Nuevos bordes de vía a construir

Acceso vehicular de obra

Señales verticales para el control y
operación de vías públicas existentes

Señales verticales de obra existentes para
obra ampliación C.C. San Nicolás

Señales verticales de obra a implementar
para obra construcción glorieta

Sentidos de circulación y carriles existentes
y/o habilitados en cada etapa

Cruces peatonales demarcados con
líneas "Cebra" existentes

Auxiliar de tránsito

NOTAS:

1. El diseño de la señalización vertical para obra, su
instalación, localización y fabricación debe cumplir con la
normativa vigente de acuerdo con el "Manual de Señalización
Vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito
en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia" del Ministerio
de Transporte – Instituto Nacional de Vías – Resolución
1885 de 2015 y será responsabilidad del constructor su total
cumplimiento.

2. Las señales verticales deben construirse con material
retroreflectivo tipo IV, según Manual de Señalización Vial
2015 vigente. Las Señales SPO-01 y SPO-03 deben tener el
tablero de color naranja fluorescente.

3. Se debe capacitar al equipo de auxiliares de tránsito en
las funciones requeridas para otorgar el derecho de vía,
tanto a los vehículos de la vía pública como a los de la
obra, además de los peatones que circulan por los andenes
que serán intervenidos en ambos costados de la calle 41C.

4. No se permite la instalación de publicidad del proyecto o
del constructor en las señales presentadas en este plano.

5. La localización final de las señales del PMT se debe
realizar de acuerdo con las mejores condiciones de visibilidad
que imperen en el sitio.

6. No tomar medidas a escala en este plano.

7. Las señales que sean instaladas en campo deben estar
marcadas en la parte posterior con el nombre del
constructor, con el fin de diferenciarlas de las demás
señales existentes en la zona.

8. La señalización de obra a implementar debe respetar la
distancia y visibilidad de las señales verticales existentes
en campo, por lo tanto, no se pueden implementar señales que
queden cerca de otras y deben contar con una separación
mínima de 10,0m.

9. El tamaño de las señales de obra a implementar en este
PMT deben ser de acuerdo con la velocidad máxima
permitida en las vías del entorno, la cual es de 50Km/h,
por lo tanto, los señales preventivos deben tener unas
dimensiones de 60cm x 60cm, mientras que los señales
reglamentarios deben contar con un diámetro de 60cm.

10. Los accesos vehiculares y peatonales existentes del
Centro Comercial continuarán funcionando durante la
construcción de la Etapa 4.

11. Se recuerda que el CC San Nicolás actualmente cuenta
con el permiso para la operación del PMT que corresponde a
la ampliación del área comercial donde se plantea la
conformación de la Etapa 4. En el permiso se cuenta con
un acceso a obra por el costado sur del predio con frente
hacia la calle 41C y otro acceso por el costado norte del
predio con frente hacia la calle 43. Estos accesos serán
conservados durante la ejecución de las actividades
complementarias por fuera del predio.

12. Se presenta este PMT puntual para llevar a cabo la
construcción del intercambio vial a nivel tipo glorieta sobre la
calle 41C entre la carrera 56 y diagonal 53, esto es al
frente del área que está siendo intervenida como ampliación
del centro comercial San Nicolás.

13. La construcción del intercambio será construido en 4
etapas proyectadas donde siempre se garantizará la
circulación vehicular en al menos un carril con sección
mínima de 3,5m y además se contará con uno de los
andenes existentes bien sea en el costado sur o norte para
permitir la circulación de peatones a lo largo de la calle
41C.

14. No se requiere implementar cierres totales de calzada en
los cuales se deba llevar a cabo recorridos alternos de
desvío, por tal motivo, los residentes y visitantes de la zona
y del centro comercial, conservarán las mismas maniobras
de accesibilidad.

15. En este plano se presenta el esquema de los cierres de
obra y las señales a implementar durante la ejecución de la
Etapa 3 proyectada de obra.

CONSTRUCTORA: MUROS Y TECHOS INGENIEROS ARQUITECTOS	INTERVENTORIA: INTER LG S.A.S.	CONSULTOR: Vías y Tránsito Especialistas en Vías y Transporte Carrera 43A No 14-27 Of: 702 Medellín a.velez.vyt@gmail.com	DISEÑO: DANIEL CEBALLOS Mat: 291102 Ant. REVISÓ: ÁLVARO VÉLEZ Mat: 55524 Ant.	MODIFICACIONES: I II III IV V	ESCALAS: 1:750 SISTEMA: AutoCAD V2021	PROYECTO: C.C. SAN NICOLÁS – CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL TIPO GLORIETA A NIVEL SOBRE CALLE 41C ENTRE DIAGONAL 53 Y CARRERA 56	CONTIENE: INFRAESTRUCTURA ACTUAL, CIERRE DE OBRA Y SEÑALES TEMPORALES DE OBRA A IMPLEMENTAR EN ETAPA 3	FECHA: Septiembre 2024 PLANO No. 03/04 ARCHIVO: PMT de obra
--	--	--	--	--	--	--	---	--
